11.12.2017

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42
dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

DROVIA
Bogdan Bloch
Grafitowa 45 m. 4
72-006 Mierzyn

W/ znak:
N/ znak: PSGWH00/DT/ZMS-5000-101258/17

z dnia - -
z dnia 30-11-2017

Uzgadnianie tras innych urządzeń podziemnych
NR PSGWH00/DT/ZMS-5000-101258/17

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie"

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. **zachodniopomorskie,** gm. **Szczecin,** m. **Szczecin,** ul. **Hrubieszowska**

W nawiązaniu do złożonego w naszym Zakładzie wniosku dotyczącego inwestycji pn. „Przebudowa ul. Hrubieszowskiej w Szczecinie" informujemy, że w granicach opracowania - obszarze objętym ww. zadaniem posiadamy czynną sieć gazową niskiego ciśnienia (oznaczoną na schemacie sieci gazowej wg legendy) zgodnie z podanym poniżej wyszczególnieniem:

1. Gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 mm stal. ułożony w ciągu ul. Hrubieszowskiej włączony do gazociągu DN 250 mm stal. w ul. Ku Słońcu – wybudowany w 1988 r.
2. Gazociąg niskiego ciśnienia dn 225 PE ułożony w ciągu ul. Hrubieszowskiej, kontynuacja gazociągu wymienionego w pkt. 1 – wybudowany w 1994 r.
3. Gazociąg niskiego ciśnienia dn 180 PE ułożony w ciągu ul. Spiskiej, włączony do gazociągu dn 225 PE wymienionego w pkt. 2 – wybudowany w 1994 r.
4. Gazociąg niskiego ciśnienia dn 90 PE ułożony w drodze bocznej (dz. Nr ewid. 35/13), włączony do gazociągu DN 200 mm stal. wymienionego pkt. 1 wraz z przyłączami gazowymi dn 63 PE szt. 2 do budynków nr 34 i 68 przy ul. Hrubieszowskiej – wybudowany w 1995 r.
5. Przyłącze gazowe niskiego dn 63 PE do budynku Nr 16-28 przy ul. Hrubieszowskiej, włączone do gazociągu DN 200 mm stal. wymienionego w pkt. 1 – wybudowane w 1995 r.
6. Przyłącze gazowe niskiego dn 90 PE do budynku Nr 10-12 przy ul. Hrubieszowskiej, włączone do gazociągu dn 225 PE wymienionego w pkt. 2 – wybudowane w 1995 r.
7. Przyłącze gazowe niskiego dn 90 PE do budynku Nr 4-8 przy ul. Hrubieszowskiej, włączone do gazociągu dn 225 PE wymienionego w pkt. 2 – wybudowane w 1995 r.
8. Przyłącze gazowe niskiego dn 63 PE do budynków Nr 3 i 5 przy ul. Hrubieszowskiej, włączone do gazociągu dn 225 PE wymienionego w pkt. 2 – wybudowane w 1998 r.

Sieć gazowa wymieniona w punktach od 1) do 8) w zależności od lokalizacji (jezdnia, chodnik, pobocze) ułożona jest na różnych głębokościach posadowienia od 0,6 m do 1,0 m (zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach jej budowy – w odniesieniu do ówczesnych rzędnych terenu).

Opisana powyżej sieć gazowa wniesiona jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu, na których sporządzony został plan sytuacyjny przedmiotowego zadania oraz wrysowana na załączonym przez nas schemacie sieci gazowej.

Istniejąca czynna sieć gazowa zlokalizowana w obrębie zadania pn. „Przebudowa ul. Hrubieszowskiej w Szczecinie" jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.
W odniesieniu do w/w czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla w/w sieci gazowej, na czas jej użytkowania wyznaczone zostały strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2, tabela 2 do w/w rozporządzenia) i wyznaczone zostały pasy eksploatacyjne równe strefom kontrolowanym o szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m opisanej powyżej sieci gazowej Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować jej uszkodzenie lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a wszelkie prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższym projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowego zadania pn. „Przebudowa ul. Hrubieszowskiej w Szczecinie" należy sporządzić/uzupełnić zgodnie z poniżej podanymi uwagami:

a) W miejscach, w których zlokalizowana jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi/miejsc postojowych powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej.

b) Odległości poziome mierzone od osi gazociągów do krawędzi jezdni (krawężników) nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.

c) W miejscach istniejącej wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejących skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni.

d) Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Gazownię Szczecin - Południe (ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 482 05 71, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.

e) W strefach kontrolowanych o szerokości 1-go metra istniejącej w rejonie opracowania czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów, a wszelkie prace budowlano-montażowe w tych strefach należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

h) Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

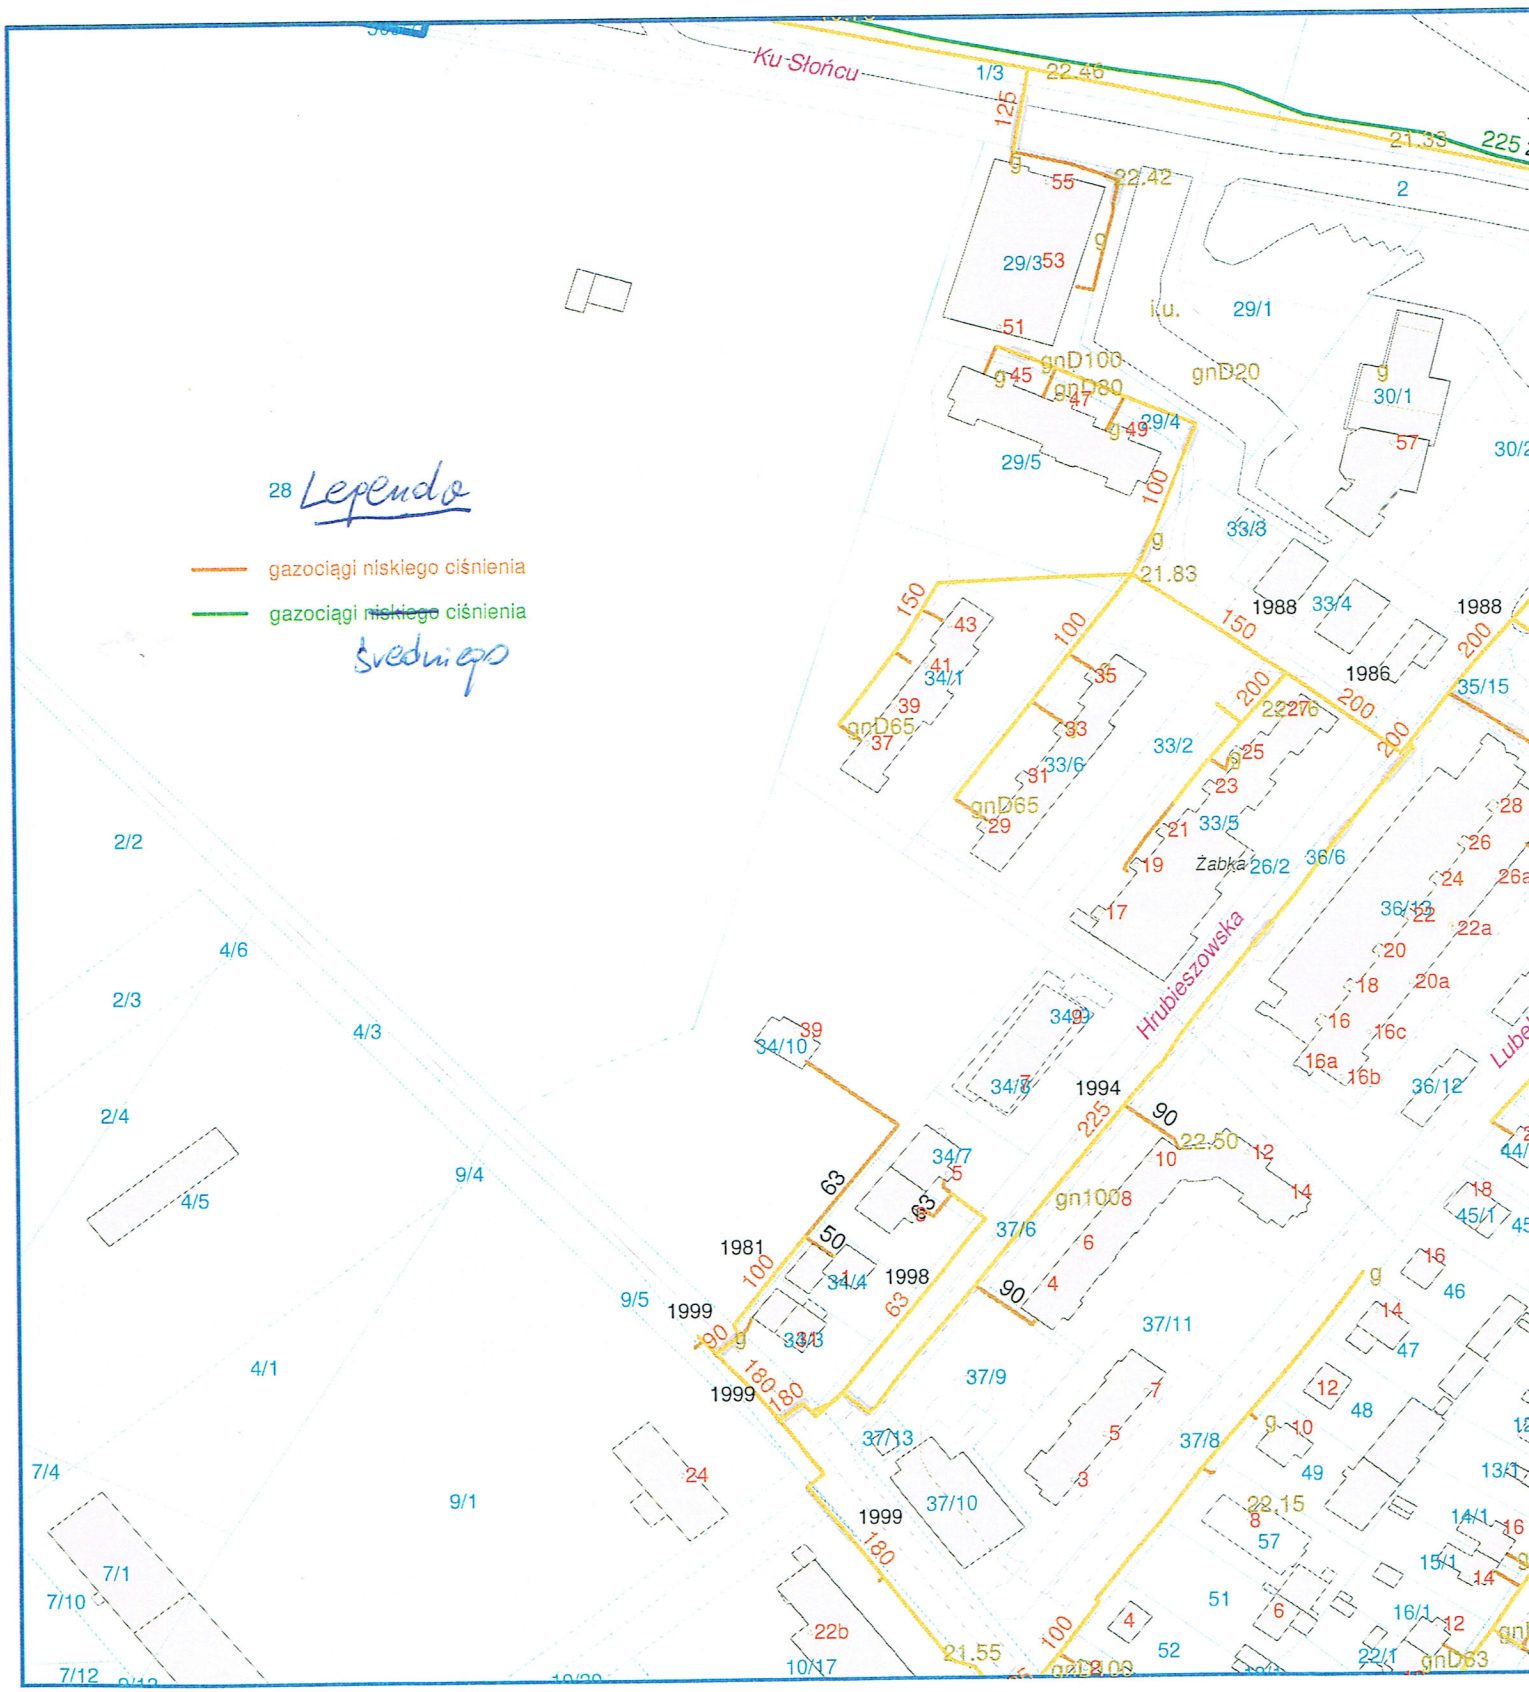
O ile zostanie stwierdzona kolizja planowanej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Hrubieszowskiej w Szczecinie" z istniejącą siecią gazową, Inwestor w/w zadania powinien wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej, z którą koliduje planowana inwestycja.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy
w Szczecinie
Dariusz Szopik

Do wiadomości:
1. Gmina Miasto Szczecin
   Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
   71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5
2. Gazownia Szczecin Południe
3. PSG-WH00/DT/ZMS a/a

Załączniki:
1. Schemat sieci gazowej
2. wstępny układ geometryczny


28 Lependo
gazociągi niskiego ciśnienia
gazociągi ~~niskiego~~ ciśnienia
średniego
Ku Słońcu
Hrubieszowska
Żabka
gnD100
gnD80
gnD20
gnD65
gn1008
1/3
22.46
125
22.42
55
29/3
53
51
29/1
45
47
49
29/4
29/5
30/1
57
100
33/3
21.83
150
43
41
34/1
39
37
35
33
33/6
31
33/2
200
22.76
25
23
21
33/5
29
19
26/2
36/6
17
1988
33/4
1986
35/15
28
26
24
26a
36/12
22
22a
20
20a
18
16
16c
16a
16b
34/9
34/8
1994
225
90
22.50
10
12
14
34/10
39
34/7
5
63
50
1981
1998
34/4
1999
37/6
6
4
37/11
37/9
37/13
37/10
37/8
7
5
3
180
24
22b
10/17
21.55
52
51
8
57
22.15
48
49
47
46
45/1
44
16
15/1
16/1
22/1
gnD63
2
2/2
2/3
2/4
4/6
4/3
4/5
9/4
9/5
4/1
9/1
7/4
7/1
7/10
7/12

PSG-WH00/DT/2MS-5000+/012581/17
Załącznik Nr 1 Schemat sieci perowej

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział
Zakład w Szczecinie
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marek Michałowski

